

临沭政务督查

沭政督字〔2018〕99号

临沭县人民政府办公室 关于全县重点民生工程图片现状和手续办理 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

为切实抓好重点民生工程的督促落实，县政府办公室在对2018年实施的民生工程和民生实事实行周调度、月通报的基础上，从中筛选了19项投资额度大、社会关注度高、易于显现形象进度的工程类项目，本着“未开工工程促手续办理、已开工工程促工程进度”的原则，于每月20日—22日以调度手续办理进展、拍摄图片和视频的形式，督促手续办理、记录工程进度、完善工程资料。同时，根据工程手续办理、形象进度和节点计划完

成情况与上月进行比对，每月在督查通报中分为“推进快速”、“推进正常”和“推进缓慢”三个等次。截至目前，已开工的13项民生工程中有12项工程正在按照前期制定的节点计划稳步推进，为“推进正常”等次，水城建设工程本月应完成陡沟桥建设及清淤疏浚工作，目前桥梁未建设、河道未清淤，落后时间节点，为“推进缓慢”等次；未开工的6项工程正在办理前期手续，其中顺河西路、县高级中学本月分别完成2项、1项手续办理，苍源河体育公园、苍源河实验学校，县人民医院综合服务楼、感染楼，城东一路等4个项目手续办理无新进展。

8月22日，国务院第十五督查组已进驻山东开展实地督查，“保障和改善民生”被列为5个重点专项督查内容之一，对此，各级各有关部门务必要高度重视，切实增强政治意识、大局意识和责任意识。当前即将进入9月份，正是关键节点攻坚期、安装施工高峰期，主体完工的项目要进一步加快收尾工作进度，争取早日竣工、早日发挥应有的效益；在建的项目要在保证工程质量和安全生产的前提下，倒排工期、挂图作战，确保按时完成工程建设；暂未开工的项目要认真分析原因，大力破解瓶颈制约，切实加快前期手续办理和清障征迁工作，争取尽快开工。各相关职能部门要切实增强服务意识，进一步简化审批程序，创新工作方式，提高工作效率，全力以赴推动工程建设。下一步，县政府办公室将继续加大对全县重点民生工程进展情况的通报力度，对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报

批评。

附件：1．重点民生工程进展情况的现状图片
2．重点民生工程手续办理情况一览表

临沭县人民政府办公室

2018 年 8 月 24 日

附件 1

重点民生工程进展情况的现状图片

1. 常林大街综合整治工程



4 月 20 日进展情况




5 月 20 日进展情况



6 月 20 日进展情况



7 月 20 日进展情况

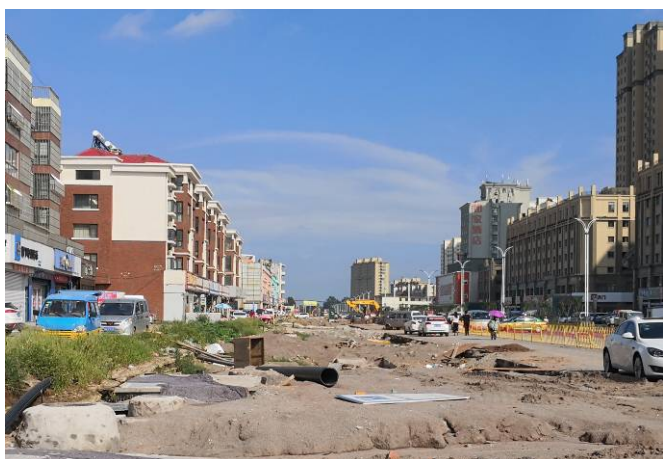


(正源路以东段)



(正源路以西段)

8 月 20 日进展情况

2. 体育中心二期建设工程

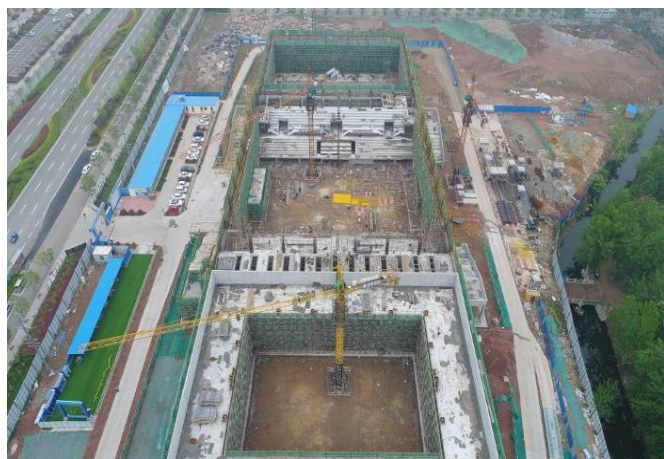

4 月 20 日进展情况



5 月 20 日进展情况



6 月 20 日进展情况



7 月 20 日进展情况



8 月 20 日进展情况

3. 创业大厦建设工程



4月20日进展情况



5月20日进展情况



6月20日进展情况



7月20日进展情况



8月20日进展情况

4. 正大街苍源河大桥建设工程



4 月 20 日进展情况



5 月 20 日进展情况



6 月 20 日进展情况



7 月 20 日进展情况



8 月 20 日进展情况

5. 青云山路北段道路建设工程



3月20日进展情况



5月20日进展情况



6月20日进展情况



7月20日进展情况



8月20日进展情况

6. 正大街西段道路建设工程



6月20日进展情况



7月20日进展情况



(青云山路以东段)



(青云山路以西段)
8月20日进展情况

7. 临沭县残疾人托养中心建设工程



4月20日进展情况



5月20日进展情况



6月20日进展情况



7月20日进展情况



8月20日进展情况

8．朝阳街道路建设工程



3 月 20 日进展情况



6 月 20 日进展情况



(金牛路至 225 省道段)

7 月 20 日进展情况



(牛腿沟桥段)

8 月 20 日进展情况

9. 郑山污水处理厂建设工程



4月20日进展情况



5月20日进展情况



6月20日进展情况



7月20日进展情况



8月20日进展情况

10．沭河新村橡胶坝建设工程



4 月 20 日进展情况



5 月 20 日进展情况



6 月 20 日进展情况



7 月 20 日进展情况



8 月 20 日进展情况
(橡胶坝主体工程 7 月已完工，正在进行泵房建设)

11 . 沭河滨河大道建设工程



5 月 20 日进展情况



6 月 20 日进展情况



(钟华山段南向)



(钟华山段北向) 7 月 20 日进展情况
(属防洪堤 , 8 月暂停施工)

12．老省道北段改造工程



6月20日进展情况



7月20日进展情况



8月20日进展情况


13．水城建设工程



7月7日进展情况（拆除陡沟桥）



7月20日进展情况（新陡沟桥基础开挖）

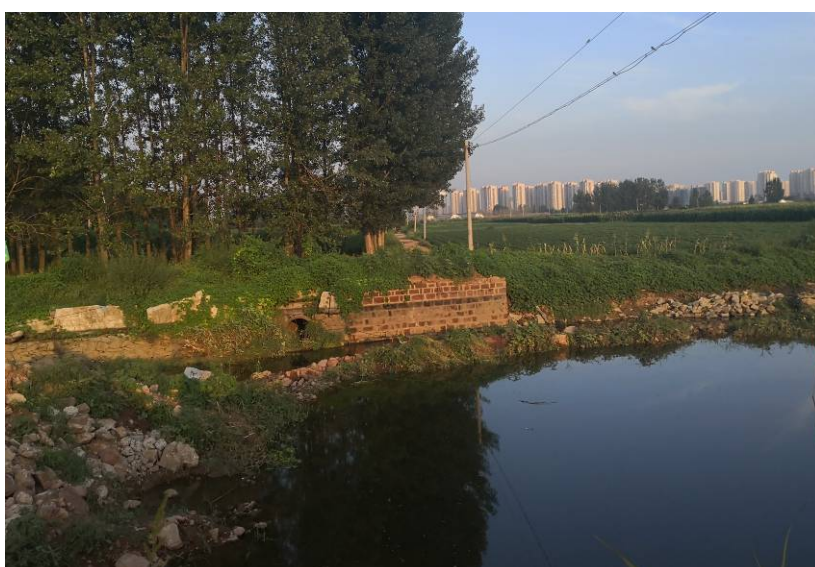

8月20日进展情况

附件 2

重点民生工程手续办理情况一览表

1. 苍源河体育公园建设工程

同意项目建设意见	节能备案报告	节能评审批复	项目用地现状图	项目选址意见书
√	√	√	√	√
可研单位确定	环评单位确定	项目用地	勘查单位备案及勘察报告审查	设计备案
√	√	√	√	√
施工图出图及审查	环评影响评价执行标准意见	土地符合规划证明	土地利用总体规划	符合用地规划证明
√	√	√	○	○
土地预审意见	工程规划许可证	项目核准批复	项目核准初审意见	监理单位招标及备案
○	○	○	○	×
施工单位招标及备案	施工许可证	地上附着物清理	场地平整	生活用水管道施工
×	×	×	×	×
临时用电线路施工	公用道路、进场道路、雨污水管道施工			
×	×			

2. 顺河西路道路建设工程

项目选址意见书	同意项目建设意见	项目用地现状图	土地利用总体规划	可研单位确定
√	√	√	√	√
环评单位确定	项目用地	勘查单位备案及勘察报告审查	设计备案	施工图出图及审查
√	√	√	√	√
初步设计审查	环评影响评价执行标准意见	土地符合规划证明	项目核准批复	项目核准初审意见
√	√	√	√	√
符合用地规划证明	用地规划许可证	土地划拨	工程规划许可证	土地证
√	√	○	○	○
节能备案报告	节能评审批复	监理单位招标及备案	施工单位招标及备案	施工许可证
○	○	×	×	×
地上附着物清理	场地平整	临时用电线路施工	公用道路、进场道路、雨污水管道施工	生活用水管道施工
×	×	×	×	×

注：已完成标注√，正在办理标注○，未办理标注×；加粗项为新完成办理。

3 . 临沭县高级中学建设工程

符合用地规划证明	同意项目建设意见	节能备案报告	项目用地现状图	项目选址意见书
√	√	√	√	√
土地符合规划证明	土地利用总体规划	可研单位确定	环评单位确定	水土保持
√	√	√	√	√
地质勘测及详勘报告	水资源论证	环评总量审批	环评报告书上报 评审、批复	环评影响评价执行 标准意见
√	√	√	√	√
项目核准批复	项目核准初审意见	水土保持费用减免	勘查单位备案及 勘察报告审查	节能评审批复
√	√	√	√	√
设计备案	初步设计审查	用地规划许可证	项目用地	施工图出图及审查
√	√	√	○	○
土地证	地上附着物清理	电力接入系统可研及批 复	土地预审意见	临时用电线路施工
○	○	×	×	×
生产用水管道施工	监理单位招标及备 案	施工单位招标及备案	土地划拨	墙改基金征收审核
×	×	×	×	×
生活用水管道施工	工程规划许可证	公用道路、进场道路、雨 污水管道施工	安全生产专篇审 查	建设项目抗震审核 意见书
×	×	×	×	×
消防备案	防雷设施审核	施工许可证	印章刻制	生产用水、中水水质 监测
×	×	×	×	×
气象资料	场地平整	污水接收证明	供水证明	飞灰接收证明
×	×	×	×	×

4 . 苍源河实验学校建设工程

符合用地规划证明	同意项目建设意见	项目用地现状图	项目选址意见书	土地符合规划证明
√	√	√	√	√
土地利用总体规划	可研单位确定	地质勘测及详勘报告	项目核准批复	项目核准初审意见
√	√	√	√	√
环评单位确定	环评总量审批	节能备案报告	节能评审批复	水土保持
√	√	√	√	√
用地规划许可证	勘查单位备案及勘察报告审查	环评报告书上报评审、批复	设计备案	水土保持费用减免
√	√	√	√	√
初步设计审查	环评影响评价执行标准意见	施工图出图及审查	水资源论证	土地预审意见
√	√	√	√	√
项目用地	地上附着物清理	场地平整	电力接入系统可研及批复	监理单位招标及备案
○	○	○	×	×
施工单位招标及备案	公用道路、进场道路、雨污水管道施工	土地划拨	生产用水管道施工	工程规划许可证
×	×	×	×	×
建设项目抗震审核意见书	安全生产专篇审查	土地证	墙改基金征收审核	消防备案
×	×	×	×	×
防雷设施审核	施工许可证	印章刻制	临时用电线路施工	气象资料
×	×	×	×	×
生产用水、中水水质监测	生活用水管道施工	污水接收证明	供水证明	飞灰接收证明
×	×	×	×	×

5 . 临沭县人民医院综合服务楼、感染楼建设工程

项目用地	环境与卫生防护距离边界测绘图	可研单位确定	环评单位确定	环评报告书上报评审、批复
○	×	×	×	×
勘查单位备案及勘察报告审查	节能备案报告	节能评审批复	地上附着物清理	环评公众调查问卷
×	×	×	×	×
地质勘测及详勘报告	项目用地现状图	临时用电线路施工	公用道路、进场道路、雨污水管道施工	同意项目建设意见
×	×	×	×	×
社会维稳评价	环评第二次公示	地质灾害评估	水土保持	土地利用总体规划
×	×	×	×	×
项目选址意见书	土地符合规划证明	符合用地规划证明	建设项目抗震审核意见书	场地平整
×	×	×	×	×
生产用水管道施工	生活用水管道施工	电力接入系统可研及批复	土地预审意见	设计备案
×	×	×	×	×
监理单位招标及备案	施工单位招标及备案	用地规划许可证	土地划拨	初步设计审查
×	×	×	×	×
工程规划许可证	施工图出图及审查	安全生产专篇审查	土地证	墙改基金征收审核
×	×	×	×	×
消防备案	防雷设施审核	施工许可证	公司注册	企业名称预核准通知
×	×	×	×	×
印章刻制	项目核准批复	项目核准初审意见	开展前期工作的函	环评影响评价执行标准意见
×	×	×	×	×
环评第一次公示	气象资料	生产用水、中水水质监测	水土保持费用减免	污水接收证明
×	×	×	×	×
同意项目建设证明	供水证明	飞灰接收证明		
×	×	×		

6. 城东一路道路建设工程

符合用地规划证明	同意项目建设意见	项目用地现状图	项目选址意见书	土地符合规划证明
√	√	√	√	√
土地利用总体规划	可研单位确定	环评单位确定	项目用地	地质勘测及详勘报告
√	√	√	√	√
施工图出图及审查	环评报告书上报评审、批复	地上附着物清理	场地平整	临时用电线路施工
√	√	○	○	○
监理单位招标及备案	施工单位招标及备案	用地规划许可证	土地划拨	工程规划许可证
○	○	○	○	○
施工许可证	项目核准批复	项目核准初审意见	同意项目建设证明	
○	○	○	○	
